

ATELIER DE REVUE À MI-PARCOURS DU PROJET PILOTE D'ACCÈS À L'EPHA DANS LES CENTRES DE SANTÉ DANS LES DISTRICTS SANITAIRES DE BLA (Région de Ségou) ET KORO (Région de Mopti)

Bamako - Mali

15-16 novembre 2016

PROJET “AMELIORATION DE L'ACCÈS À L'EPHA DANS LES CENTRES DE SANTÉ” Présenté par WaterAid Mali

Résumé du projet

- **Objectif** : Accès durable à l'EPHA dans les centres de santé en milieu rural du Mali.
- **Durée du Projet** : Janvier 2015 - Décembre 2017
- **Total budget** : \$ 4 400 000
- **Financement** : Conrad Hilton Foundation et WaterAid
- **Couverture** : 21 CSCOM et 2 CSRéf

Zones d'interventions

Région	Cercle	Nombre total de Centres de santé	Nombre de Centres de santé d'intervention
Mopti	Koro	24 CSCOM et 1 CSRéf	10 CSCOM et 1 CSRéf
Ségou	Bla	28 CSCOM et 1 CSRéf	11 CSCOM et 1 CSRéf

Axes d'Intervention

Evaluation et analyse situationnelle

- Etude inventaire sur les équipements EPHA
- **Etude de référence sur les infections**
- Etude CAP sur la gestion de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et des déchets

Fourniture des services durables EPHA

- Construction/ rehabilitation des ouvrages (eau et assainissement)
- Mise en place d'un dispositif de stockage d'eau interne de sécurité
- Connexion en eau des unités fonctionnelles
- Equipement en postes d'eau potable/ incinérateurs/ dispositifs de lavage des mains
- Dotation en kits d'hygiène et d'assainissement
- Promotion d'hygiène

Mettre les 23 centres de santé aux normes définies dans le Paquet minimum WASH

Renforcement des capacités

- Formation des ASACO
- Formations du personnel de santé en GDBM
- Elaboration de deux guides/ materiel pour l'amélioration de la fourniture des services d'eau
- **Appui à l'élaboration d'un plan AEPHA/ CSCOM**
- Appui à l'élaboration d'un Plan Stratégique AEPHA dans les centres de santé.

Suivi & Coordination

- Point mensuel d'état d'exécution des activités
- Rencontres semestrielles de suivi
- Suivi des effets après l'équipement en dispositifs de lavage des mains
- Suivi des effets après la réalisation des points d'eau
- Documentation des études de cas.
- **Réunion nationale de Task force**

Cadre partenarial

□ OMS

- Appui sur l'élaboration des normes et de la stratégie EPHA dans les centres de soins

□ CDC/Atlanta

- Recherche sur l'impact de lavage des mains

□ DNS/ DRS

- Appui technique
- Renforcement de capacités/ suivi des normes

□ WaterAid et ONG partenaires

- Fourniture des services
- Renforcement des capacités
- Promotion de l'hygiène

Réalisations du projet (1/7)

Objectif 1: Evaluation et analyse situationnelle

- Etude de base sur l'accès des centres de santé à l'eau potable
- Une étude diagnostique des ouvrages d'eau existants
- Une étude diagnostique des ouvrages d'assainissement
- Une évaluation complète de l'état d'accès à l'EPHA dans l'ensemble des centres de santé des districts sanitaires de Bla et de Koro
- 1 évaluation de base sur les infections périnatales et la pratique des lavages des mains par le personnel de santé

Réalisations du projet (2/7)

Objectif 2: Fourniture des services durables EPHA (1/3)

- 12 Centres de santé équipés d'une AES avec connexion en eau des unités fonctionnelles / Réceptionnés et en service
- 11 Centres de santé équipés d'une AES avec connexion en eau des unités fonctionnelles / Réception en janvier 2017
- 21 CSCOM et 2 CSRéf équipés de dispositifs de lavage des mains mobiles et de postes d'eau potable.

Réalisations du projet (3/7)

Objectif 2: Fourniture des services durables EPHA (2/3)

- 8 cabines réalisées dans les CSCOM de Niamana et Bogoni / Réceptionnés et en service
- 32 cabines à construire et 50 cabines à réhabiliter dans les 12 centres de santé de Bla / Réception en mars 2017
- 23 cabines à construire et 33 cabines à réhabiliter dans les 11 centres de santé de Koro / Réception en mars 2017
- Réhabilitation des buanderies des CSRéf
- Réalisation en cours de lavoir-puisards dans les 21 CSCOM / Réception en mars 2017

Réalisations du projet (4/7)

Objectif 2: Fourniture des services durables EPHA (3/3)

- 15 incinérateurs installés / Réceptionnés
- 8 incinérateurs en cours / Réception en janvier 2017
- 9 thèmes de promotion d'hygiène ont été identifiés et déroulés dans les centres de santé à travers les infirmières
- La réalisation de 2 journées de lavage des mains au savon
- La réalisation de la campagne Départ sain dans le district de Bla
- Une visite des parlementaires dans six (6) centres de santé de la région de Ségou dans le cadre de la campagne « **Un Départ Sain** »

Réalisations du projet (5/7)

Objectif 3: Renforcement des capacités

- Recrutement de 2 infirmières et formées en WASH
- Signature de protocoles d'accord avec les DRS de Ségou et de Mopti
- La Formation des ASACO des 21 CSCOM et des comités de gestion des 2 CSRéf
- La Formations du personnel de santé sur l'hygiène
- La Formations du personnel de santé en GDBM
- La formation sur le processus d'élaboration du PGSE (WASH FIT)
- L'appui à l'élaboration des PGSE
- Equipement de 2 CSRéf en motos

Réalisations du projet (6/7)

Objectif 4: Suivi & Coordination (1/2)


- Ateliers de lancement au niveau national et régional
- Réalisation d'une mission de suivi conjointe DNS/DRS – OMS – WaterAid
- Appuis à la mise en place d'un groupe de travail national (Task Force)
- Participation aux ateliers d'élaboration et de quantification du paquet minimum WASH en milieu de soins
- Participation à la validation des documents au niveau national (manuel de procédure de GDBM, directives PCI, module de formation WASH/PCI ...)

Réalisations du projet (7/7)

Objectif 4: Suivi & Coordination (2/2)

- Participation à l'atelier national de formation des formateurs sur le PGSE à Bamako
- Participation à l'atelier régional de renforcement de capacité sur le PGSE (WASH FIT) à Dakar
- Mission de suivi post formation des ASACO par la DRS de Ségou
- Missions de supervision des activités par les DRS de Ségou et Mopti
- Missions de suivi / supervision des activités par WAM
- La réalisation d'une étude de cas et d'une vidéo sur le projet

Quelques illustrations (1/2)

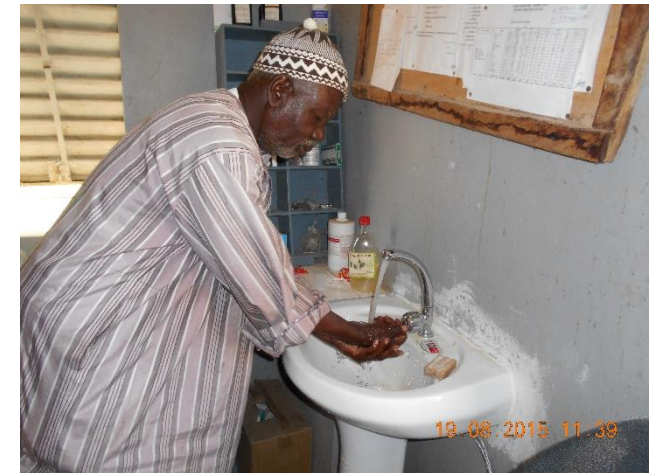

Quelques illustrations (2/2)



Difficultés / défis

- Restriction du déplacement de l'équipe de CDC compte tenu de l'insécurité
- Réalisation de forage négatif à Barapireli après 3 tentatifs
- Mobilisation du financement pour la couverture totale des deux districts
- La maintenance et le renouvellement des kits
- Motivation et engagements des bénéficiaires
- Changement de comportement durable

Perspectives (1/2)

- Réception en **janvier 2017** des travaux de réalisation des points d'eau dans les 11 CSCOM restant
- Finalisation en **décembre 2016** de l'Installation de système de chloration dans les 2 CSRéf
- Fourniture avant **mars 2017** de dispositif Kit Wata pour la production de chlore dans les 21 CSCOM y compris la formation
- Finition en **mars 2017** des travaux de réalisation des ouvrages d'assainissement en cours (latrines et lavoir-puisards)
- Réception en **janvier 2017** de 8 incinérateurs
- Appui à l'élaboration des PGSE pour le district de Koro

Perspectives (2/2)

- Dotation en kits d'hygiène et d'assainissement (**mars 2017**)
- Carrelage des unités de soins (**décembre 2017**)
- Organisation d'un concours centre de santé propre (**décembre 2017**)
- Organisation d'ateliers par district pour les actions de perennisation

Merci pour votre attention
